

1

Lab - MP

Lista de activitati

Cuprins

2

- Lista de rezultate
- Activitățile unui proiect

3

Lista de rezultate

Livrabile - exemple

4

rezultat livrabil (*deliverable* - în l.engl);
documentelor justificative a rezultatelor
realizate

exemple de livrabile pot fi: un studiu de fezabilitate, un
proiect de detaliu sau un prototip funcțional.

Livrabilele unui proiect trebuie descrise în
detaliu astfel încât clientul să înțeleagă
foarte bine la ce trebuie să se aștepte.

Livrabilele proiectului

5

- o listă de documente care trebuie să fie livrate pentru a îndeplini obiectivele definite ale proiectului
- cine îl realizează și cum trebuie să fie livrat
- data de livrare estimată pentru fiecare document

Exemplu

6

Proiectul este “realizarea unui nou plan de comunicare pentru organizația noastră”, principalele livrabile pot fi:

- Un nou website;
- Un raport al rețelelor sociale;
- Un buletin informativ regulat;
- Un ciclu de seminarii informative pentru utilizatorii finali.


Lista de rezultate - exemplu

7

Nr. livrabil	Denumire livrabil	Nr. WP	Coord. WP	Natura livrabilului	Nivelul de diseminare	Data livrării
1.1	Tehnologii inovative ale sistemului	1	CO	IT	PU	M8
1.2	Servicii inovative ale sistemului	1	CO	IS	PU	M12
2.1	Model Functional pentru interfata utilizator a sistemului	2	CO	FM	CO	M12
2.2	Model Functional pentru agregatorul de continut bazat pe comentariile online	2	CO	FM	CO	M12
2.3	Model Functional pentru componenta de analiza statistica si semantica a sistemului	2	CO	FM	CO	M12
2.4	Model Functional pentru sistemul de administrare	2	CO	FM	CO	M12
3.1	Model Experimental pentru sistemul de administrare	3	P1	EM	PU	M20
3.2	Analiza rezultatelor testarii Modelului Experimental al sistemului	3	P1	EM	CO	M20
4.1	Prototipul sistemului	4	P2	P	PU	M24
4.2	Demonstrarea functionalitatii si utilitatii sistemului	4	P2	D	PU	M24

Lant de rezultate – model logic

8

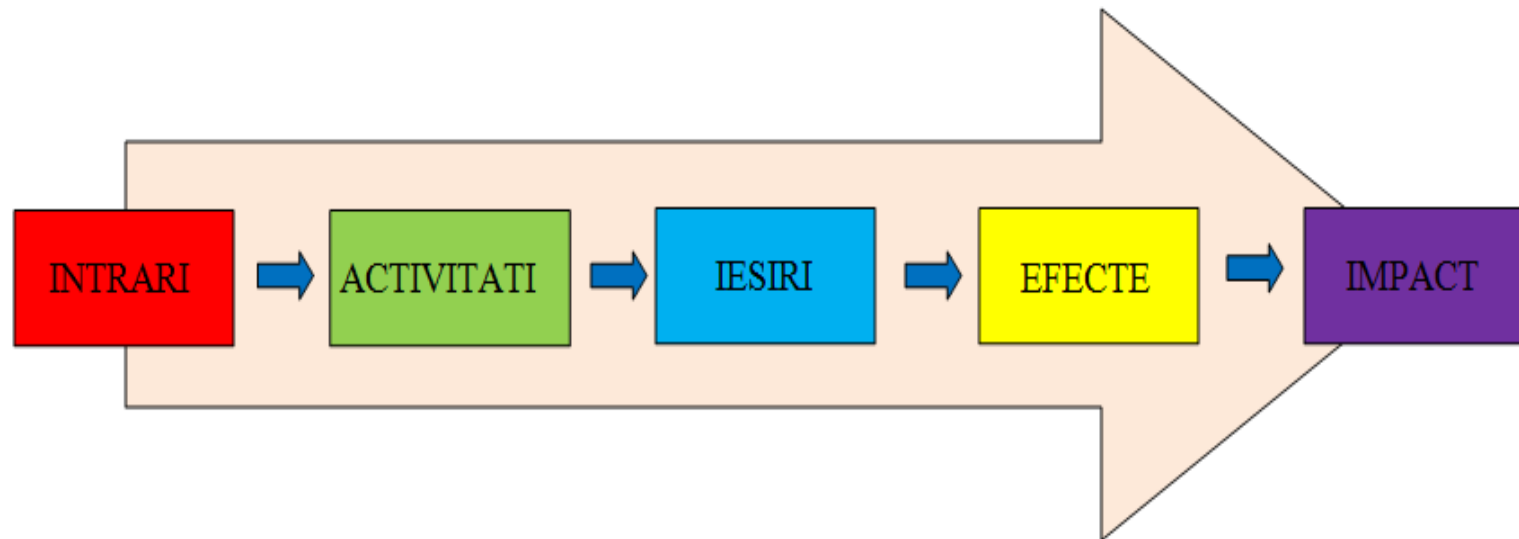

Lant de rezultate – model logic

9

- **Intrarile:** resursele necesare realizarii activitatilor proiectului (materiale, umane, financiare si de timp).
- **Activitatile:** actiuni sau interventii care convertesc intrarile in iesiri pentru a produce rezultatele dorite, cum sunt: comunicarea, training-ul, constructia, organizarea si managementul.
- **Iesirile:** bunuri si servicii produse prin activitatile proiectului cum ar fi: training-ul indivizilor, structurile fizice, documentele sau organizatiile formate. Acesta este cel mai inalt nivel al ierarhiei scopurilor asupra caruia proiectul are control.
- **Efectele:** beneficii sau schimbari ca urmare a activitatilor proiectului, practici, comportamente, proceduri, procese, politici, produse, servicii. Efectele sunt rezultatul atingerii cu succes a iesirilor si realizarea lor depinde de logica ipotezelor proiectului.
- **Impactul** – consecinte care se manifesta intr-un timp mai indelungat; o schimbare fundamentala intr-un sistem sau societate. Impactul poate fi de exemplu: cresterea cererii unui produs sau serviciu, cresterea calitatii unor bunuri sau servicii, cresterea gradului de sanatate a populatiei sau chiar cresterea nivelului de trai.

10

Activitățile unui proiect

Activitate - definiție

11

- O *activitate* este un element de muncă, efectuat în timpul derulării proiectului, a cărui executare poate fi încredințată unei persoane fizice competente (sau mai multor membri ai echipei).
- Termenul de *sarcină* este considerat, în general, în planificare, ca fiind sinonim cu activitate.
- Lista de activități prezintă activitățile necesare obținerii rezultatelor proiectului.

Planul de realizare

12

- **WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE) – l.engl**
 - O descompunere ierarhica, orientata catre livrabile, a activitatilor ce urmeaza a fi intreprinse de catre echipa de proiect, in scopul atingerii obiectivelor propuse → predarea livrabilelor.
 - Fiecare nivel descrescator presupune o descriere mai detaliata in raport cu precedentul nivel.

Fiecare activitate are următoarele caracteristici principale:

13

- rol bine determinat;
- consumă resurse fizice și umane în timp bine determinat;
- un moment de început și un moment de încheiere.

Recomandari WBS

14

- In alcatuirea WBS, focalizarea trebuie sa fie orientata spre elementele livrabile ale proiectului; cu alte cuvinte, trebuie sa ne punem intrebari de genul „ce activitati sunt necesare pentru a realiza acest element livrabil?”.
- Nu trebuie sa uitam niciun moment ca proiectul nostru este definit in primul rand prin elementele livrabile pe care le produce, traduse apoi in activitati.


Recomandari WBS



- Trebuie să reflecte modul în care managerul de proiect intenționează să gestioneze proiectul
- Accentul trebuie pus pe îndeplinirea obiectivelor proiectului
- Cu cât este mai complex un proiect, cu atât avem mai multe niveluri în WBS

Reprezentare WBS

16

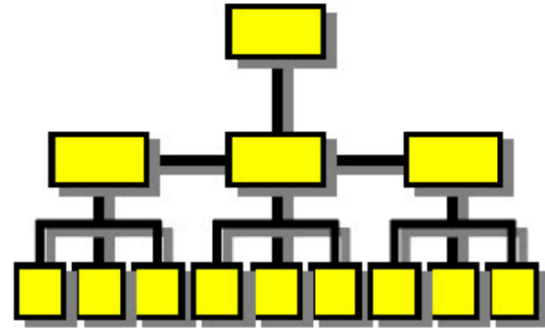

□ Arbore

- Utila - ofera o imagine de ansamblu a proiectului

□ Lista identata


- Populara – usor de creat si editat (ex. EXCEL)

□ Tabel


Level	WBS Code	Task Name
1	1	Requirements
2	1.1	Activity A
2	1.2	Activity B
2	1.3	Activity C
1	2	Design
2	2.1	Activity A
2	2.2	Activity B
2	2.3	Activity C
1	3	Construction
2	3.1	Activity A
2	3.2	Activity B
2	3.3	Activity C
1	4	Testing
2	4.1	Activity A
2	4.2	Activity B
2	4.3	Activity C

- 1. Requirements**
 - 1.1 Activity A
 - 1.2 Activity B
 - 1.3 Activity C
- 2. Design**
 - 2.1 Activity A
 - 2.2 Activity B
 - 2.3 Activity C
- 3. Construction**
 - 3.1 Activity A
 - 3.2 Activity B
 - 3.3 Activity C
- 4. Testing**
 - 4.1 Activity A
 - 4.2 Activity B
 - 4.3 Activity C

Exemplu WBS

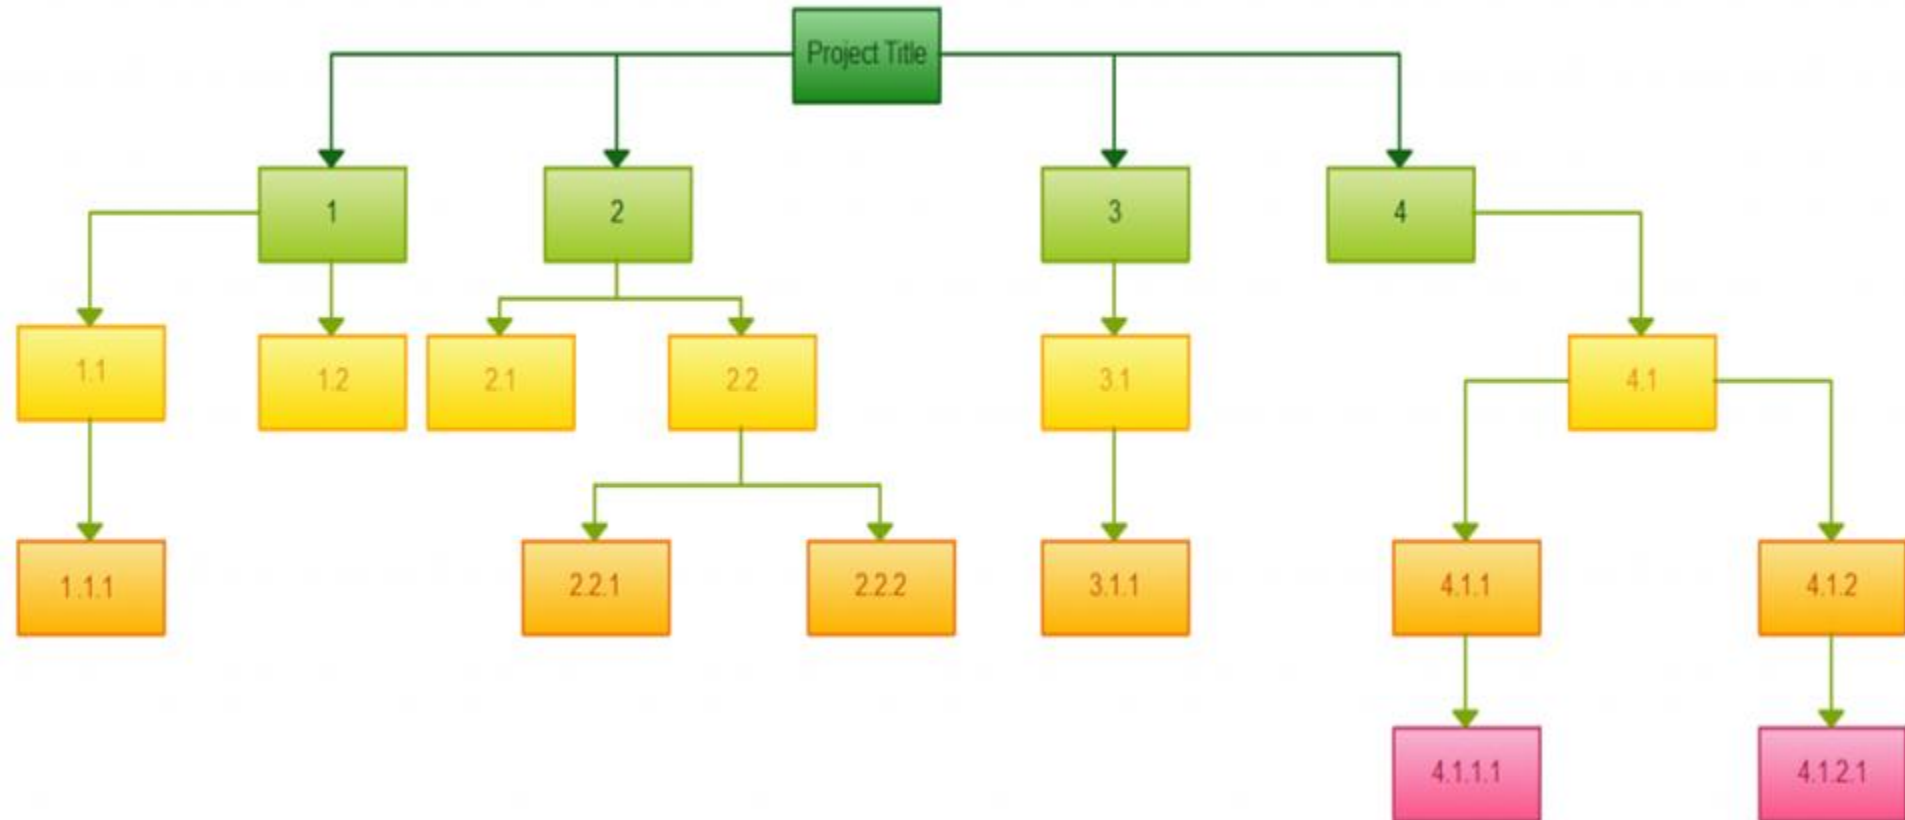


Exemplu WBS

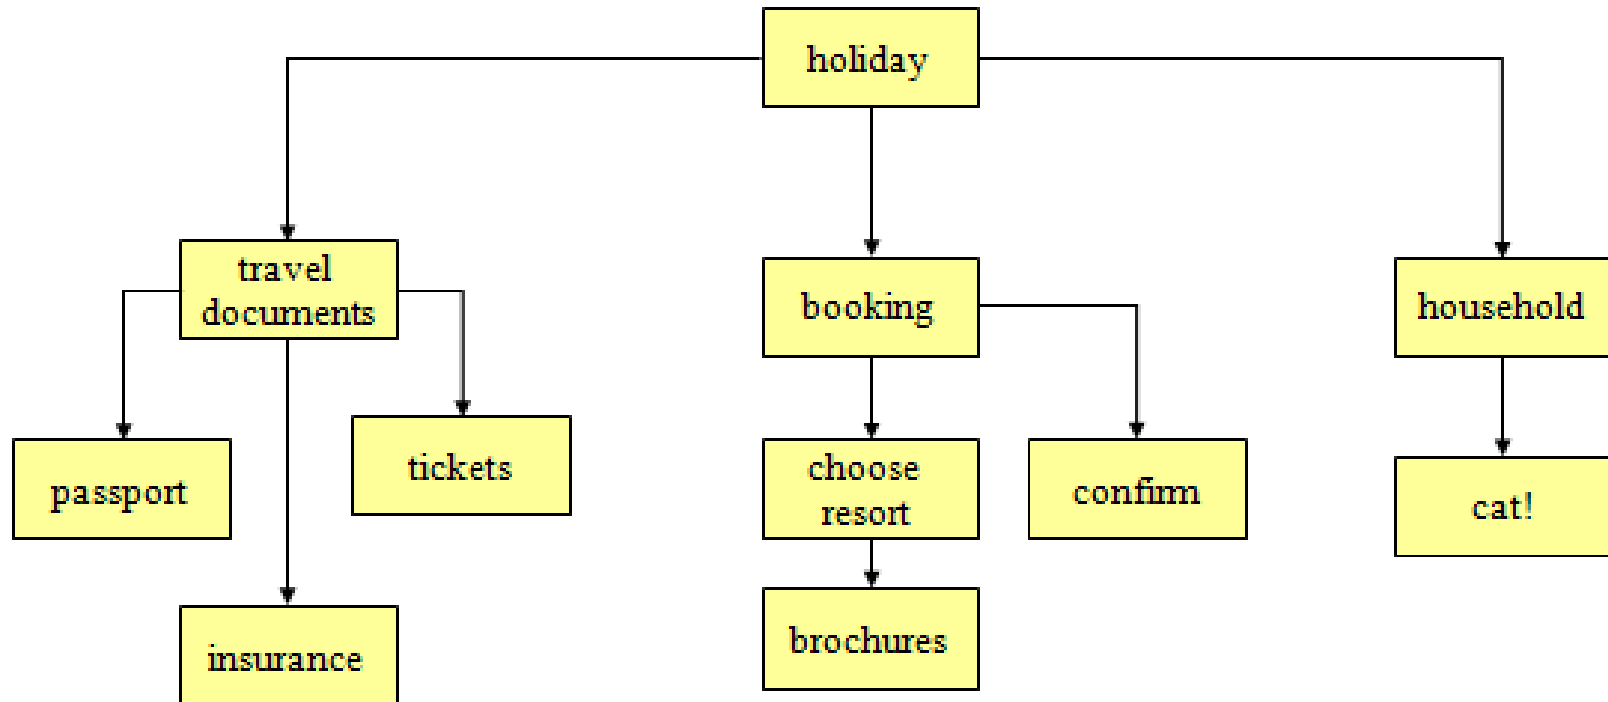

Exemplu defalcare activitati WBS


- Redecorate Room
 - ▣ Prepare materials
 - Buy paint
 - Buy a ladder
 - Buy brushes/rollers
 - Buy wallpaper remover
 - ▣ Prepare room
 - Remove old wallpaper
 - Remove detachable decorations
 - Cover floor with old newspapers
 - Cover electrical outlets/switches with tape
 - Cover furniture with sheets
 - ▣ Paint the room
 - ▣ Clean up the room
 - Dispose or store left over paint
 - Clean brushes/rollers
 - Dispose of old newspapers
 - Remove covers


Exemplu WBS

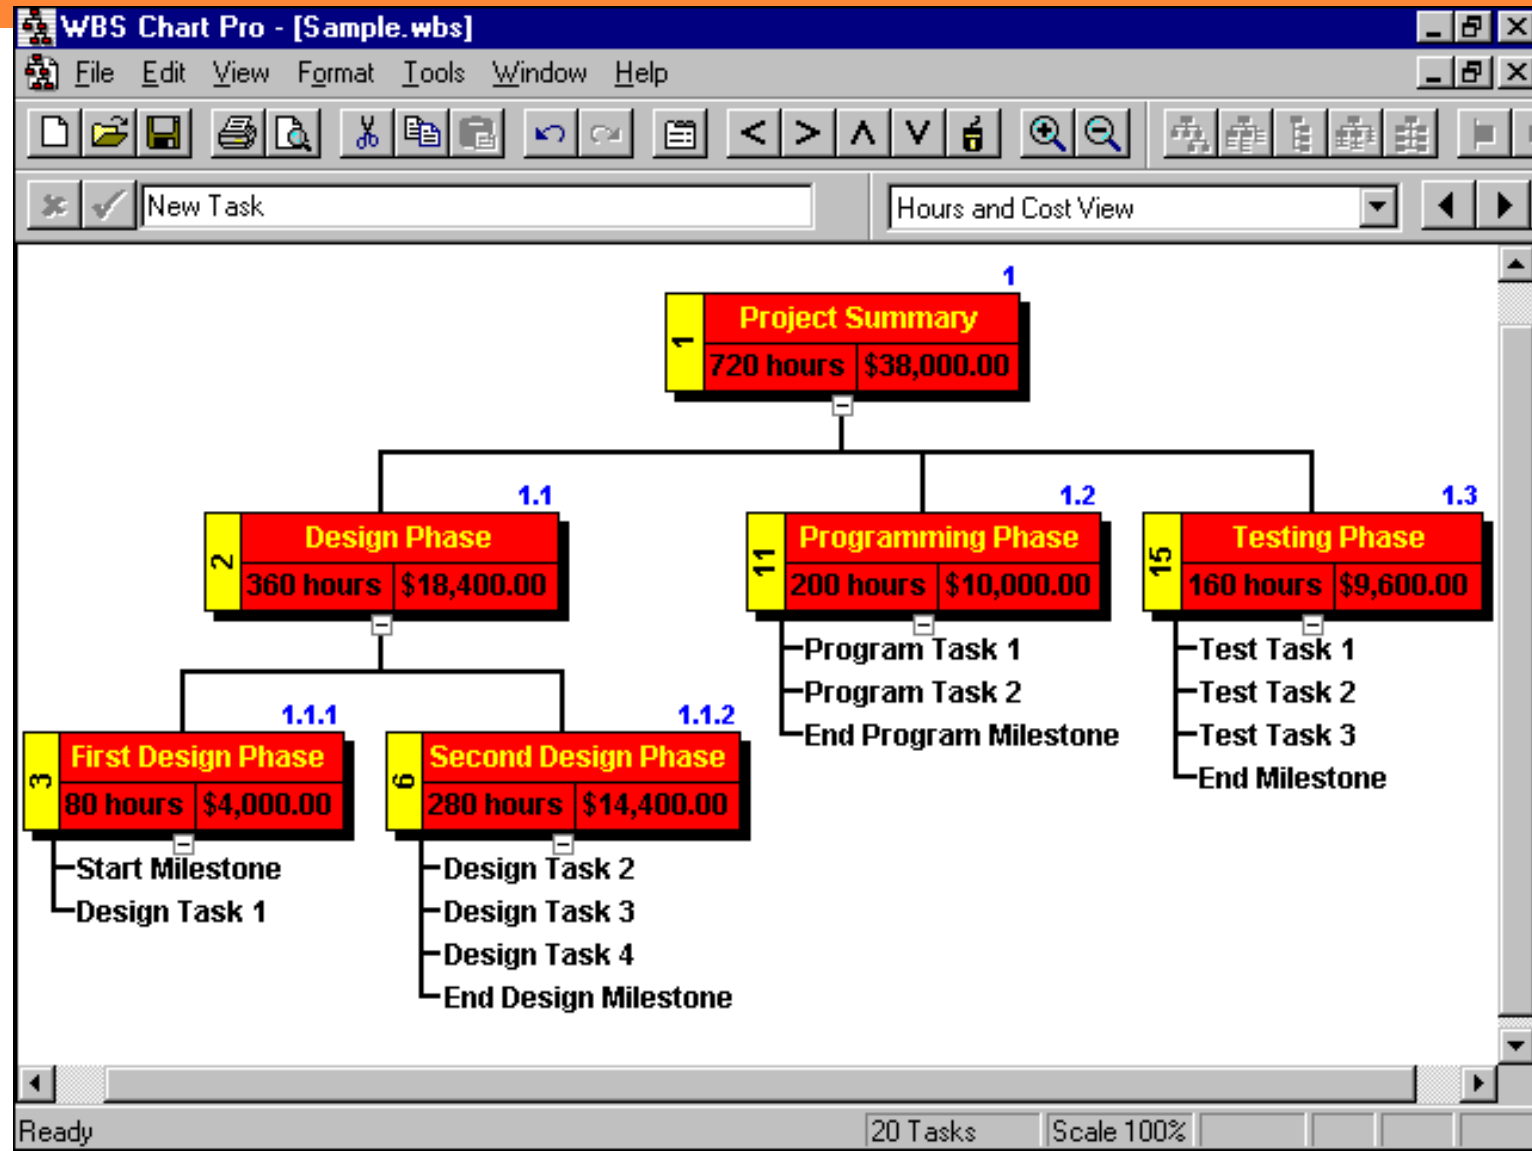

Etape - Plan de realizare

21

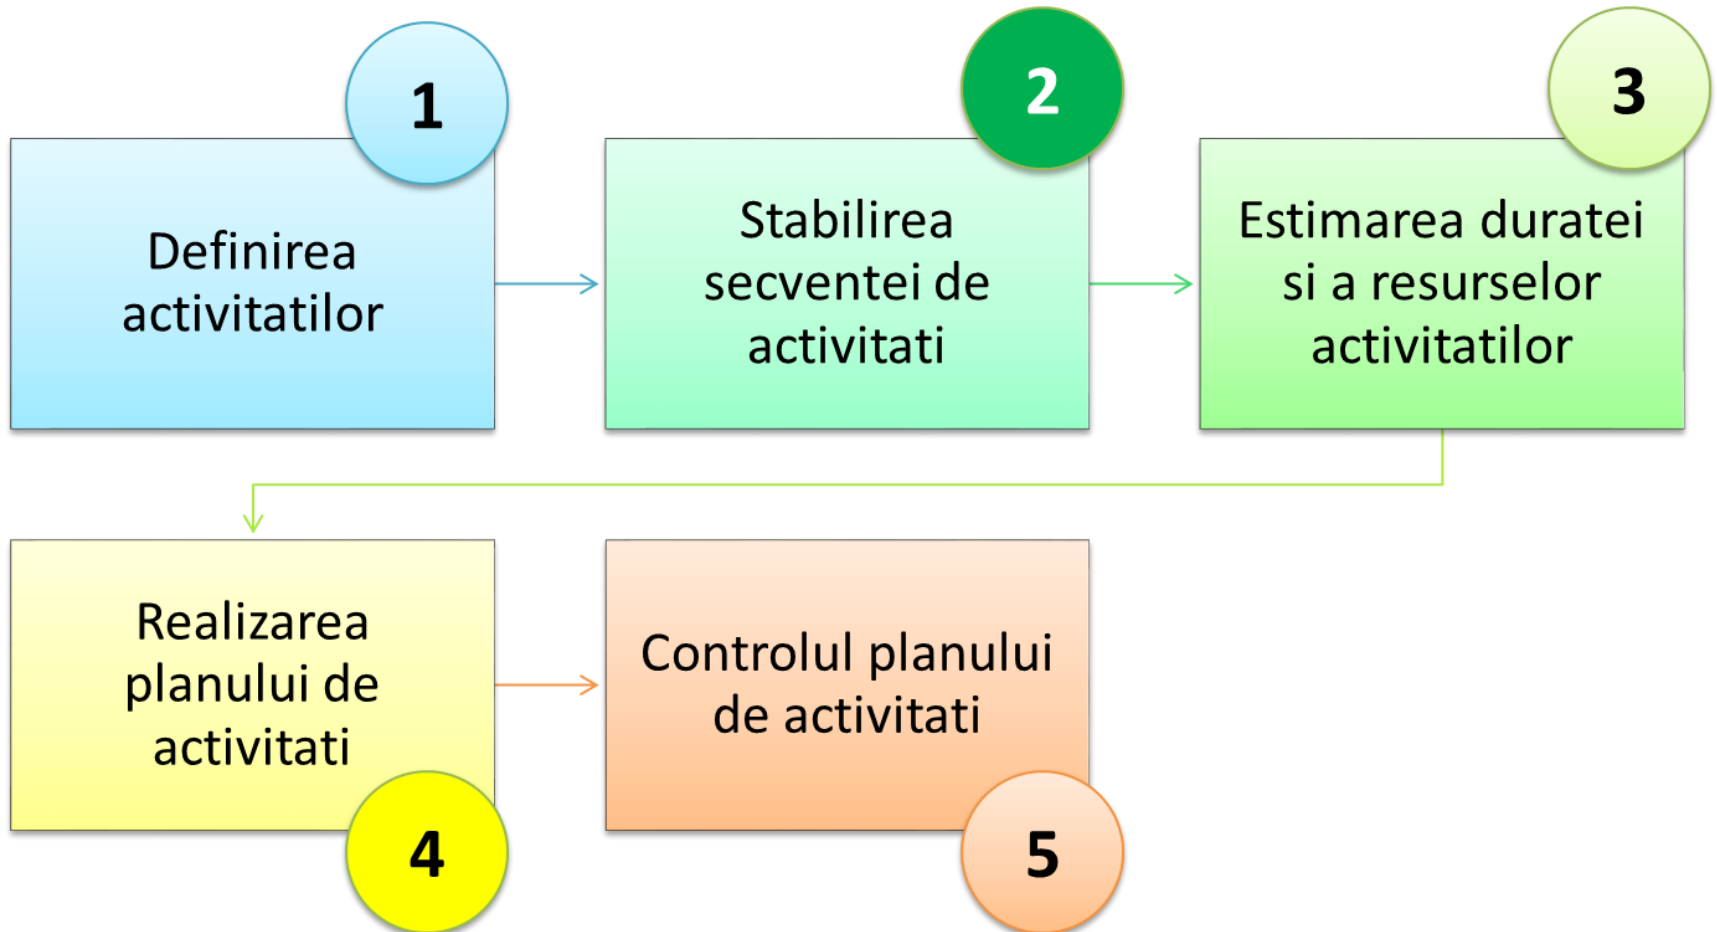

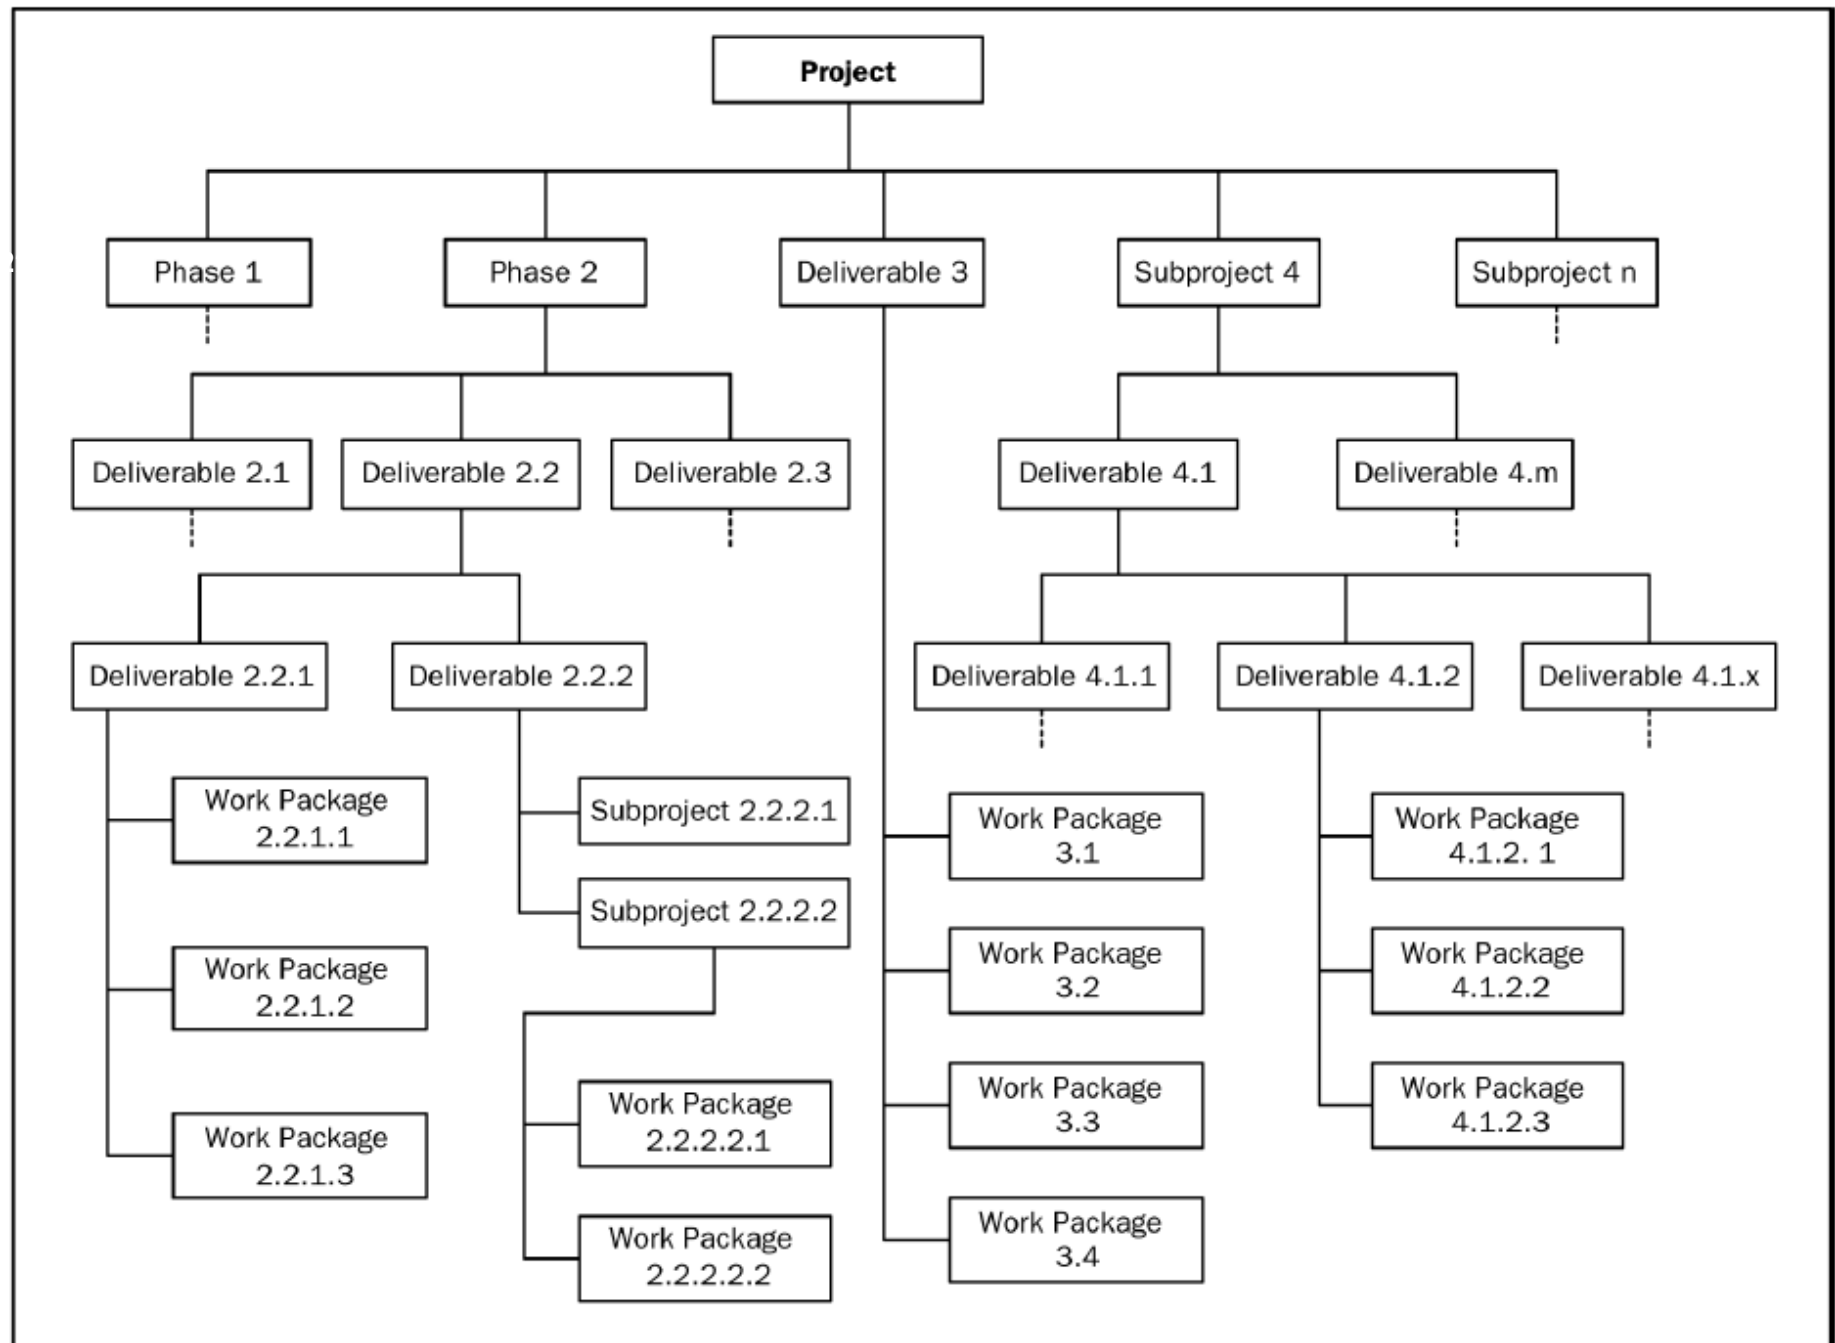

Pachete de lucru

23

- Elementele de pe nivelul cel mai detaliat (cel mai de jos în schema WBS) sunt denumite *pachete de lucru*. Fiecare pachet de lucrări este caracterizat prin definirea lucrărilor de realizat, un responsabil unic, un buget și elemente de termene, fie o durată, fie legături cu alte pachete anterioare sau posterioare.
- Pachetele de lucru definesc *sarcini* specifice care contribuie la realizări definite.

Nr. WP	4					
Titlu WP	Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului experimental in cadrul scenariilor reale de demonstrare					
Coordonator WP	P2					
Parteneri implicați	CO	P1	P2	P3	Pn	Total
Person-months						
Lună începere	M18			PACHET DE LUCR		
Lună finalizare	M24					
Obiective						
Obiectivele pachetului de lucru sunt: •Demonstrarea functionalitatilor prototipului prin implementarea in cadrul a doua demonstratoare. •Validarea sistemului prin realizarea a doua scenarii de demonstrare cu aplicabilitate reala rezultand in doua cazuri de test						
Descrierea activităților și rolul participanților						
T4.1 Testarea si validarea sistemului in cadrul scenariilor reale de demonstrare Durata activitatii: M18 – M24. Testarea sistemului se va face conform scenariilor din WP3. Se vor analiza si compara rezultatele obtinute cu specificatiile sistemului si cu rezultatele obtinute in urma testarii modelului experimental. Procesul de validare al sistemului va fi bazat pe doua demonstratoare. Primul demonstrator va implica patru portaluri pe care va fi integrat prototipul Portalurile vor fi puse la dispozitie de P1 si P2. Comentariile inregistrate vor fi analizate, cele nedorite vor fi filtrate si informatiile statistice generate vor fi livrate catre detinatorii portalurilor. Al doilea demonstrator va implica doua companii, identificate de P2, care vor permite accesul consortiului la sistemele de management de continut ale acestora. Integrarea prototipului va permite angajatilor companiilor sa comenteze subiectele propuse de companie si managerilor sa evalueze comentariile si atitudinea acestora. Partenerii implicati in acest task sunt: CO, P1, P2, P3. Rezultatele activitatii sunt incluse in D4.1 T4.2. Diseminarea rezultatelor obtinute prin demonstrarea prototipului Durata activitatii: M18 – M24. Activitatea va presupune actualizarea planului de diseminare, si a portalului web si actiuni de diseminare a rezultatelor obtinute. Partenerii implicati in acest task sunt: CO, P1.						
Livrabile (scurtă descriere și luna livrării)						
D4.1. Demonstrarea functionalitatii si utilitatii sistemului Tipul livrabilului: document; Luna livrarii: M24						

PACHET DE LUCRU

Dezvoltare software

lista generica de activitati

25

- Identificare cerinte
- Design / arhitectura
- Implementare
- Testare
- Acceptanta
- Documentare
- Mentenanta
- Management de proiect

Ordinea este stabilita in functie de metodologia folosita
